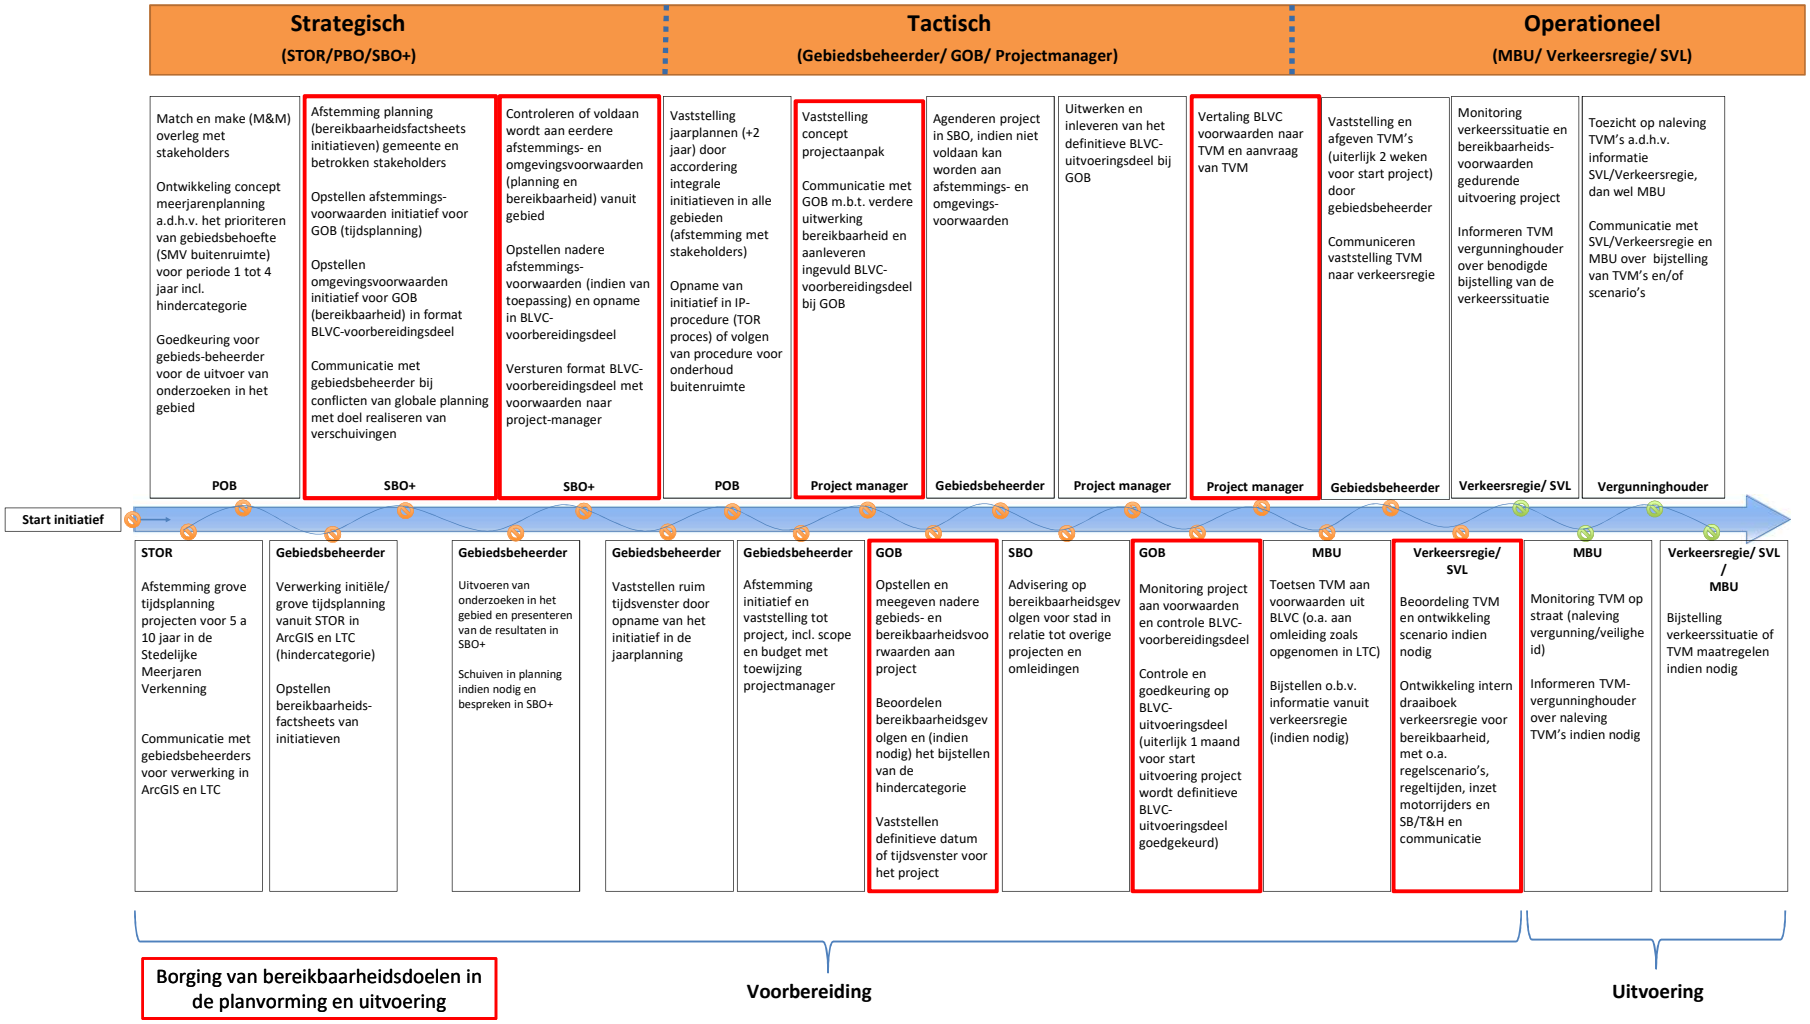
Strategisch
(STOR/PBO/SBO+)
Tactisch
(Gebiedsbeheerder/ GOB/ Projectmanager)
Operationeel
(MBU/ Verkeersregie/ SVL)
Match en make (M&M) overleg met stakeholders
Ontwikkeling concept meerjarenplanning a.d.h.v. het prioriteren van gebiedsbehoefte (SMV buitenruimte) voor periode 1 tot 4 jaar incl. hindercategorie
Goedkeuring voor gebieds-beheerder voor de uitvoer van onderzoeken in het gebied
POB
Afstemming planning (bereikbaarheidsfactsheets initiatieven) gemeente en betrokken stakeholders
Opstellen afstemmings-voorwaarden initiatief voor GOB (tijdsplanning)
Opstellen omgevingsvoorwaarden initiatief voor GOB (bereikbaarheid) in format BLVC-voorbereidingsdeel
Communicatie met gebiedsbeheerder bij conflicten van globale planning met doel realiseren van verschuivingen
SBO+
Controleren of voldaan wordt aan eerdere afstemmings- en omgevingsvoorwaarden (planning en bereikbaarheid) vanuit gebied
Opstellen nadere afstemmings-voorwaarden (indien van toepassing) en opname in BLVC-voorbereidingsdeel
Versturen format BLVC-voorbereidingsdeel met voorwaarden naar project-manager
SBO+
Vaststelling jaarplannen (+2 jaar) door accordering integrale initiatieven in alle gebieden (afstemming met stakeholders)
Opname van initiatief in IP-procedure (TOR proces) of volgen van procedure voor onderhoud buitenruimte
POB
Vaststelling concept projectaanpak
Communicatie met GOB m.b.t. verdere uitwerking bereikbaarheid en aanleveren ingevuld BLVC-voorbereidingsdeel bij GOB
Project manager
Agenderen project in SBO, indien niet voldaan kan worden aan afstemmings- en omgevings-voorwaarden
Gebiedsbeheerder
Uitwerken en inleveren van het definitieve BLVC-uitvoeringsdeel bij GOB
Project manager
Vertaling BLVC voorwaarden naar TVM en aanvraag van TVM
Project manager
Vaststelling en afgeven TVM's (uiterlijk 2 weken voor start project) door gebiedsbeheerder
Communiceren vaststelling TVM naar verkeersregie
Gebiedsbeheerder
Monitoring verkeerssituatie en bereikbaarheids-voorwaarden gedurende uitvoering project
Informeren TVM vergunninghouder over benodigde bijstelling van de verkeerssituatie
Verkeersregie/ SVL
Toezicht op naleving TVM's a.d.h.v. informatie SVL/Verkeersregie, dan wel MBU
Communicatie met SVL/Verkeersregie en MBU over bijstelling van TVM's en/of scenario's
Vergunninghouder
Start initiatief
STOR
Afstemming grove tijdsplanning projecten voor 5 a 10 jaar in de Stedelijke Meerjaren Verkenning
Communicatie met gebiedsbeheerders voor verwerking in ArcGIS en LTC
Gebiedsbeheerder
Verwerking initiële/ grove tijdsplanning vanuit STOR in ArcGIS en LTC (hindercategorie)
Opstellen bereikbaarheids-factsheets van initiatieven
Gebiedsbeheerder
Uitvoeren van onderzoeken in het gebied en presenteren van de resultaten in SBO+
Schuiven in planning indien nodig en bespreken in SBO+
Gebiedsbeheerder
Vaststellen ruim tijdsvenster door opname van het initiatief in de jaarplanning
Gebiedsbeheerder
Afstemming initiatief en vaststelling tot project, incl. scope en budget met toewijzing projectmanager
GOB
Opstellen en meegeven nadere gebieds- en bereikbaarheidsvoorwaarden aan project
Beoordelen bereikbaarheidsgevolgen en (indien nodig) het bijstellen van de hindercategorie
Vaststellen definitieve datum of tijdsvenster voor het project
SBO
Advisering op bereikbaarheidsgevolgen voor stad in relatie tot overige projecten en omleidingen
GOB
Monitoring project aan voorwaarden en controle BLVC-voorbereidingsdeel
Controle en goedkeuring op BLVC-uitvoeringsdeel (uiterlijk 1 maand voor start uitvoering project wordt definitieve BLVC-uitvoeringsdeel goedgekeurd)
MBU
Toetsen TVM aan voorwaarden uit BLVC (o.a. aan omleiding zoals opgenomen in LTC)
Bijstellen o.b.v. informatie vanuit verkeersregie (indien nodig)
Verkeersregie/ SVL
Beoordeling TVM en ontwikkeling scenario indien nodig
Ontwikkeling intern draaiboek verkeersregie voor bereikbaarheid, met o.a. regelscenario's, regeltijden, inzet motorrijders en SB/T&H en communicatie
MBU
Monitoring TVM op straat (naleving vergunning/veiligheid)
Informeren TVM-vergunninghouder over naleving TVM's indien nodig
Verkeersregie/ SVL / MBU
Bijstelling verkeerssituatie of TVM maatregelen indien nodig
Borging van bereikbaarheidsdoelen in de planvorming en uitvoering
Voorbereiding
Uitvoering
